

RESUMEN EJECUTIVO

Últimos 7 días (2026-06-29 al 2026-07-06) | Equipo: A02
Generado el 06 de julio de 2026



DROBOTS S DE RL DE CV
IVAN LOPEZ

TÉCNICOS INVOLUCRADOS

5

HORAS HOMBRE TOTALES



46.0 hrs

DÍAS REPORTADOS

3

ACTIVIDADES POR EQUIPO

HORAS POR ACTIVIDAD

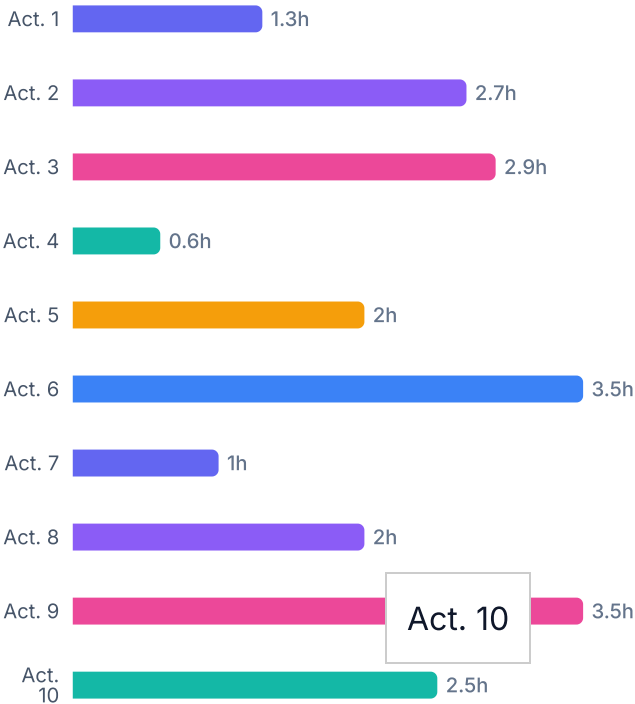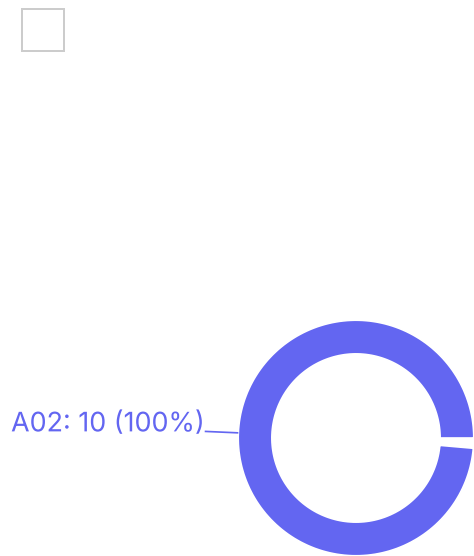

SÍNTESIS EJECUTIVA

Este resumen fue generado automáticamente con Gemini IA | By Chigüire Labs | Todos los derechos reservados

Aquí tienes el Resumen Ejecutivo estructurado para el equipo A02:

1. RESUMEN EJECUTIVO

Durante las jornadas del 2 al 4 de julio de 2026, se realizaron diversas intervenciones en el equipo A02. Francisco Molina Orocopey, como responsable principal, ha completado todas las actividades reportadas para el cliente TMMBC, abarcando desde el diagnóstico inicial y retiro de componentes obsoletos hasta la instalación, soldadura de líneas, conexiones eléctricas y recarga de gas de la unidad condensadora.

2. ACTIVIDADES REPORTADAS

- * 1. Equipo unidad condensadora a02 recarga gas soporte para servicio de correctivos para aires acondicionados en mixroom pintura (4/7/2026)
- * 2. Equipo unidad condensadora a02 conexiones electricas soporte para servicio de correctivos para aires acondicionados en mixroom pintura (4/7/2026)
- * 3. Equipo unidad condensadora a02 fuga alta soporte para servicio de correctivos para aires acondicionados en mixroom pintura (4/7/2026)
- * 4. Equipo unidad condensadora a02 soporte para servicio de correctivos para aires acondicionados en mixroom pintura (4/7/2026)
- * 5. Soldadura unidad interior condensadora a02 - soporte para servicio de correctivos para aires acondicionados en mixroom pintura (3/7/2026)
- * 6. Ajustes equipo: condensadora a02 - soporte para servicio de correctivos para aires acondicionados en mixroom pintura (3/7/2026)
- * 7. Habilitado y soldadura de lineas de cobre alta y baja presión. - soporte para servicio de correctivos para aires acondicionados en mixroom pintura (3/7/2026)
- * 8. Equipo a02 - colocar equipo correctamente y retirar ducto (2/7/2026)
- * 9. Equipo a02 - retiro de ducteria obsoleta a planta tratadora y residuos de equipo anterior (2/7/2026)
- * 10. Equipo a02 - diagnostico inicial (2/7/2026)

3. PENDIENTES

Sin pendientes registrados.

4. MATERIALES REQUERIDOS

- * 1x cople 1 1/8
- * 1x tanque de gas para soldar
- * 2x rollos de Lija plomería
- * 5x Ductape
- * 6x varilla soldadura de plata

- * 5x Tape de aluminio
- * 4x codos de radio largo 1 1/8 cobre
- * 7x codos PVC 3/4
- * 2x espiroducto 14"
- * 1x Aislante arma Flex
- * 1x tubo 7/8 cobre tipo L
- * 1x filtro deshidratador 3/8
- * 1x primer
- * 2x Pasta absorbente de calor
- * 2x codos 3/8 cobre cobre
- * 2x turca unión 3/4
- * 1x reductor 1 1/8 a 7/8 cobre
- * 2x conector LT rectos 1/2
- * 1x nitrógeno para barrido de tuberías
- * 2x escuadras unistrut o ptr para soportar ducto de 41"x 24"
- * 1x Tubería cobre tipo L 1 1/8
- * 2x codos 45 de ductos 14"
- * 1x Reducción campana para ductos 18" a 14"
- * 1x tapón hembra liso 3/4
- * 2x codos 90 de ductos 14"
- * 2x tubo PVC 3/4
- * 1x tubería 3/8 cobre tipo L
- * 1x conector glándula 3/4
- * 2x tapones machos roscados 3/4
- * 1x pegamento
- * 2x flexible LT 1/2

5. ANEXOS - EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

EVIDENCIA DESTACADA



General



General

*Muestra representativa de evidencias. El archivo completo se encuentra en plataforma.
